

九十九里町立統合小学校校舎建設 九十九里中学校校舎改築工事 基本設計の概要について



今日の流れ

- 1 開 会
- 2 町長あいさつ
- 3 教育長あいさつ
- 4 基本設計について
- 5 質疑応答
- 6 閉 会

住民説明会
12月7日（日）
10：00～
中央公民館 講堂

1

目 次

スライド番号

1-1.	これまでの経過について・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-2.	基本設計とは・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2-1.	全体計画 町が取り組んでいる学校教育・・・・・・・・	5
2-1.	全体計画 小学校再編方針・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2-1.	全体計画 施設整備の条件・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2-1.	全体計画 児童・生徒数の推移と推計・・・・・・・・	8
2-1.	全体計画 施設整備のコンセプト・・・・・・・・	9
2-1.	全体計画 施設整備の考え方(1),(2),(3)・・・・・・	10～12
2-2.	建築計画 建物計画概要・・・・・・・・・・・・・・・・	13
2-2.	建築計画 全体イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・	14
2-2.	建築計画 配置計画（平面図）・・・・・・・・	15
2-2.	建築計画 平面計画のコンセプト・・・・・・・・	16
2-2.	建築計画 ゾーニング計画・・・・・・・・	17～18
2-2.	建築計画 教室等配置計画・・・・・・・・	19～21
3-1.	事業スケジュール・・・・・・・・	22～25
3-2.	小学校統合における業務スケジュール（案）・・・・	26

1-1. これまでの経過について

○背景


- ・全国的な少子化により、本町においても児童生徒数は年々減少しており「学校の小規模化」が進んでいる。
- ・学校の小規模化が進むと、児童生徒にとって集団で多様な考えに触れ、切磋琢磨する機会が減少するほか、複式学級など教育環境に様々な影響を及ぼすことが懸念される。

○経過

- ・令和2年 3月 九十九里町学校のあり方検討委員会 設置
- ・令和2年 7月 「九十九里町立小中学校の適正規模・適正配置について」諮問
- ・令和3年12月 「九十九里町立小中学校の適正規模・適正配置について」提言
(九十九里町学校のあり方検討委員会会議 全7回開催)
- ・令和4年11月 「九十九里町学校規模適正化・適正配置基本方針」策定
- ・令和5年 3月 九十九里町学校再編推進委員会 設置
- ・令和5年 5月 学校再編に向けた協議開始
- ・令和5年10月 九十九里町学校再編推進委員会 (令和5年度 会議 全5回開催)
- ・令和6年 4月 「九十九里町学校再編計画」策定
- ・令和6年 8月 校舎設計業務 着手
- ・令和6年12月 九十九里町学校再編推進委員会 第6回会議
- ・令和7年10月 九十九里町学校再編推進委員会 第7回会議

3

1-2. 基本設計とは

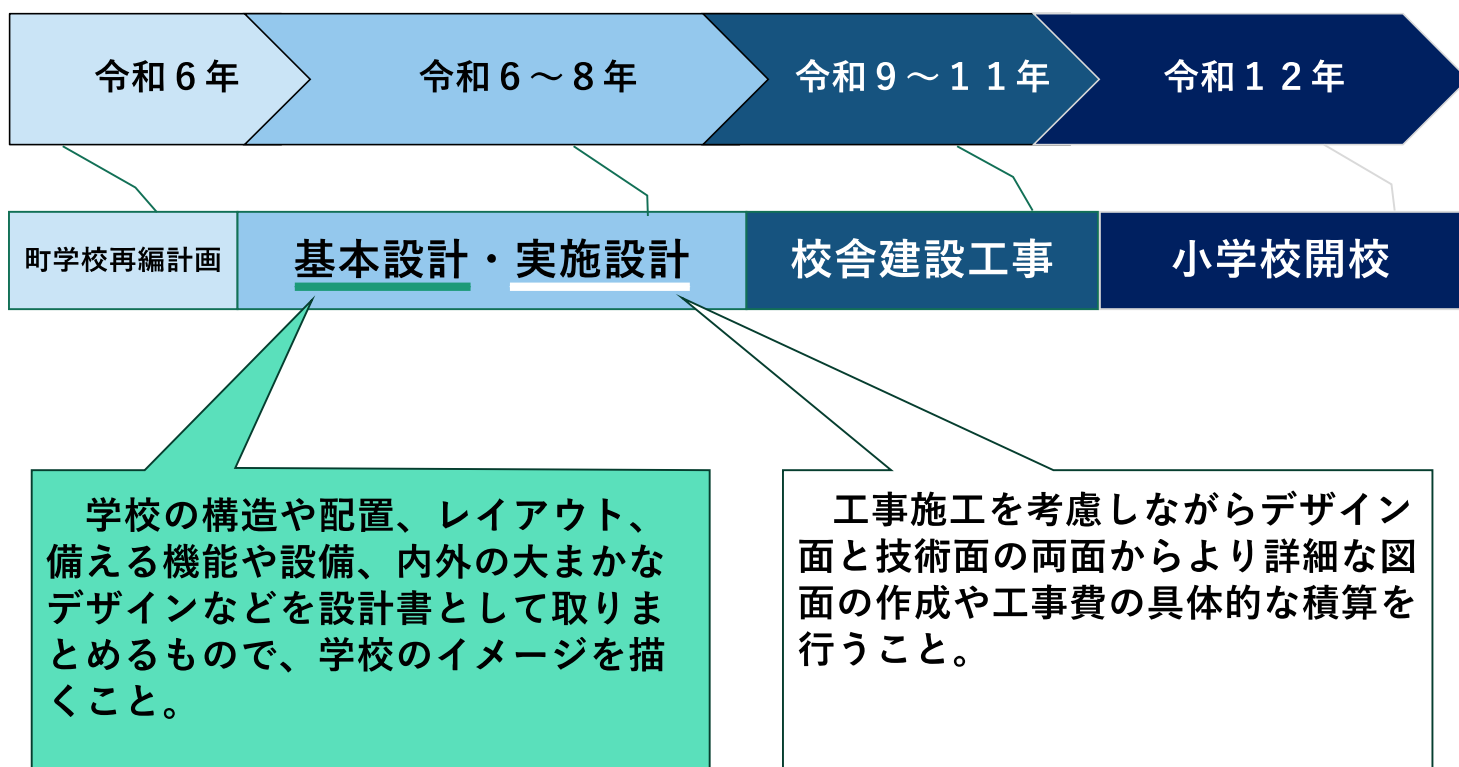

4

2-1. 全体計画 町が取り組んでいる学校教育

1. 町が取り組んでいる学校教育

九十九里町では、町の将来像として「人、自然、風土を力に未来に広がる海浜文化都市 九十九里」と掲げた「第5次九十九里町総合計画」の実現に向けて各種施策を実施しています。

教育分野では、子どもたちの基礎的な学力の向上はもとより、自ら学び、考え、行動することができるよう「生きる力を育む」、また、人や自然に対する思いやり、郷土を愛する心を養うため小中学校における教育環境の充実に学校・家庭・地域と連携し取り組んでいます。

2-1. 全体計画 小学校再編方針

2. 小学校再編方針

- (1) 再編方針 片貝小学校・豊海小学校・九十九里小学校を1校に統合する
- (2) 統合時期 令和12年4月
- (3) 統合場所 九十九里中学校敷地内
- (4) 学校施設 統合小学校校舎を新たに建設する
(中学校校舎改築工事も含む)

2-1. 全体計画 施設整備の条件


3. 施設整備の条件

- (1) 統合小学校校舎の建設に併せて、九十九里中学校校舎も含めた施設整備を計画とする。
- (2) 小学校及び中学校の校舎は、連携教育の構築性、児童・生徒の安全性及び将来的な小中一貫教育制度への移行など様々な観点を考慮し、同一棟での建設を計画とする。
- (3) 屋内運動場及びグラウンドは、既設中学校施設を可能な限り利用とする。
- (4) 小学校と中学校で共用できる諸室は、可能な限り共用とする。
- (5) 外構については、スクールバス運行に必要なバスロータリー及び停留所を整備とする。
また、駐車場は可能な限り広いスペースを確保とする。

2-1. 全体計画 児童・生徒数の推移と推計

4. 児童・生徒数の推移と推計

小学校児童数については、平成13年度に1,153人だったが、10年後の平成23年度には770人に、その10年後の令和3年度には488人まで減少した。減少傾向は今後も続くことが予想され、令和12年度の児童数は229人になることが見込まれます。

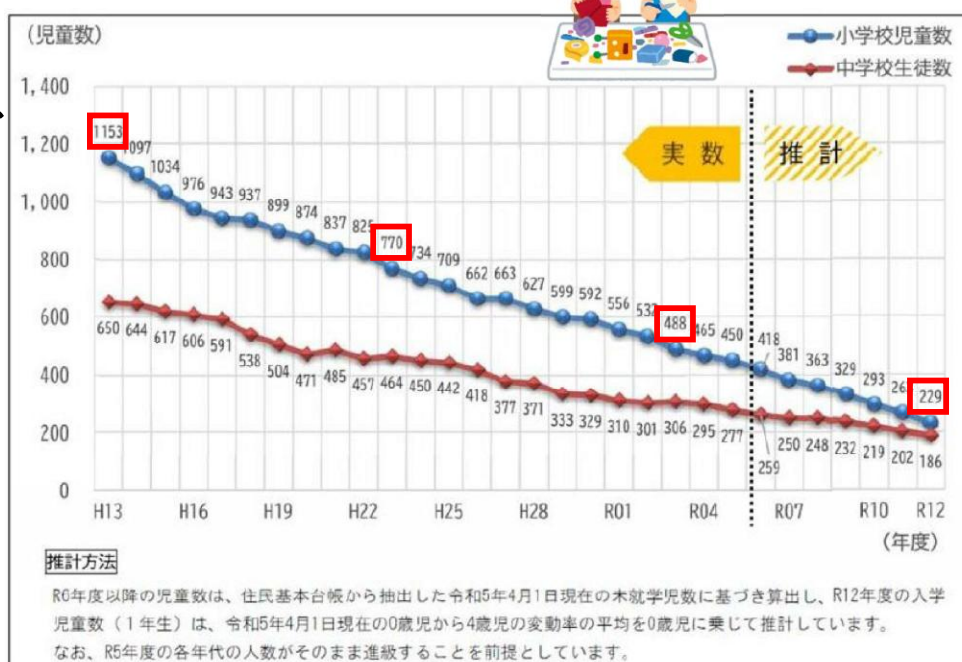

2-1. 全体計画 施設整備のコンセプト

1. 施設整備のコンセプト

新しい学校の施設整備にあたり、子どもたちにとってより良い教育環境とするため、以下の5項目を施設整備のコンセプトとする。


- (1) 快適で居心地の良い学校
- (2) 学びの変化に柔軟な対応ができる学校
- (3) 災害に強く安全・安心な学校
- (4) 小・中学校同敷地を活かした学校
- (5) 長く使い続けられる学校

2-1. 全体計画 施設整備の考え方(1)

2. 施設整備の考え方

(1) 工事計画

- ・ 工事期間中は、基本的には仮設校舎を利用しないこととし、生徒は既設中学校校舎を利用しながらの「居ながら工事」とする。
- ・ 建設工事に際し、既設のプール、部室及び倉庫は、先行して全部を解体とする。
- ・ 工事期間中は、生徒の教育活動場所を維持するため、屋内運動場及びグラウンドを利用可能としつつ、生徒の安全を最大限確保することに努める。



2-1. 全体計画 施設整備の考え方(2)

2. 施設整備の考え方

(2) 配置計画

- ・新校舎は、グラウンドや門等の敷地全体に目が届きやすいような配置とする。
- ・新校舎は、既設の屋内運動場及びグラウンド、また新設するバス停留所や駐輪場にアクセスしやすい配置とする。
- ・児童・生徒の通学方法は、徒歩・自転車・スクールバス・保護者送迎が考えられ、門の位置や通路については、動線を明確に整備し安全を確保するものとする。
- ・新校舎は、敷地周辺の住宅や農地への日影・騒音・視線等に十分配慮した配置とする。



2-1. 全体計画 施設整備の考え方(3)

2. 施設整備の考え方

(3) 平面設計

- ・小学校と中学校の生活圏が分かれるような、移動動線を工夫するとともに、共用する諸室等を介して、小中学校の交流・連携が図りやすい配置とする。
- ・特別教室は、普通教室からの移動に配慮した配置とする。
- ・校長室及び職員室等の管理諸室は、グラウンドや門扉等の敷地全体に目が届きやすい配置とする。
- ・給食室及び配膳室については、給食を衛生的に小中学校の各教室へ配膳できるような配置とする。



2-2. 建築計画 建物計画概要

◆外構・その他◆

○駐輪場

- ・ 200台を確保し、昇降口へアクセスしやすい位置に配置。

○駐車場

- ・ 校舎裏に配置し、児童・生徒・送迎車の動線と交差しない計画。

○遊具エリア

- ・ 小学校児童用に固定遊具を設置した遊具エリアの整備を計画。
- ・ 職員室等の管理諸室から見渡せる位置に配置。

○渡り廊下

- ・ 新校舎から既設屋内運動場へアクセスするために、渡り廊下の整備を計画。


○その他

- ・ 外灯は、それぞれの利用形態・動線に応じた照度の確保。

2-2. 建築計画 全体イメージ



2-2. 建築計画 配置計画(平面図)

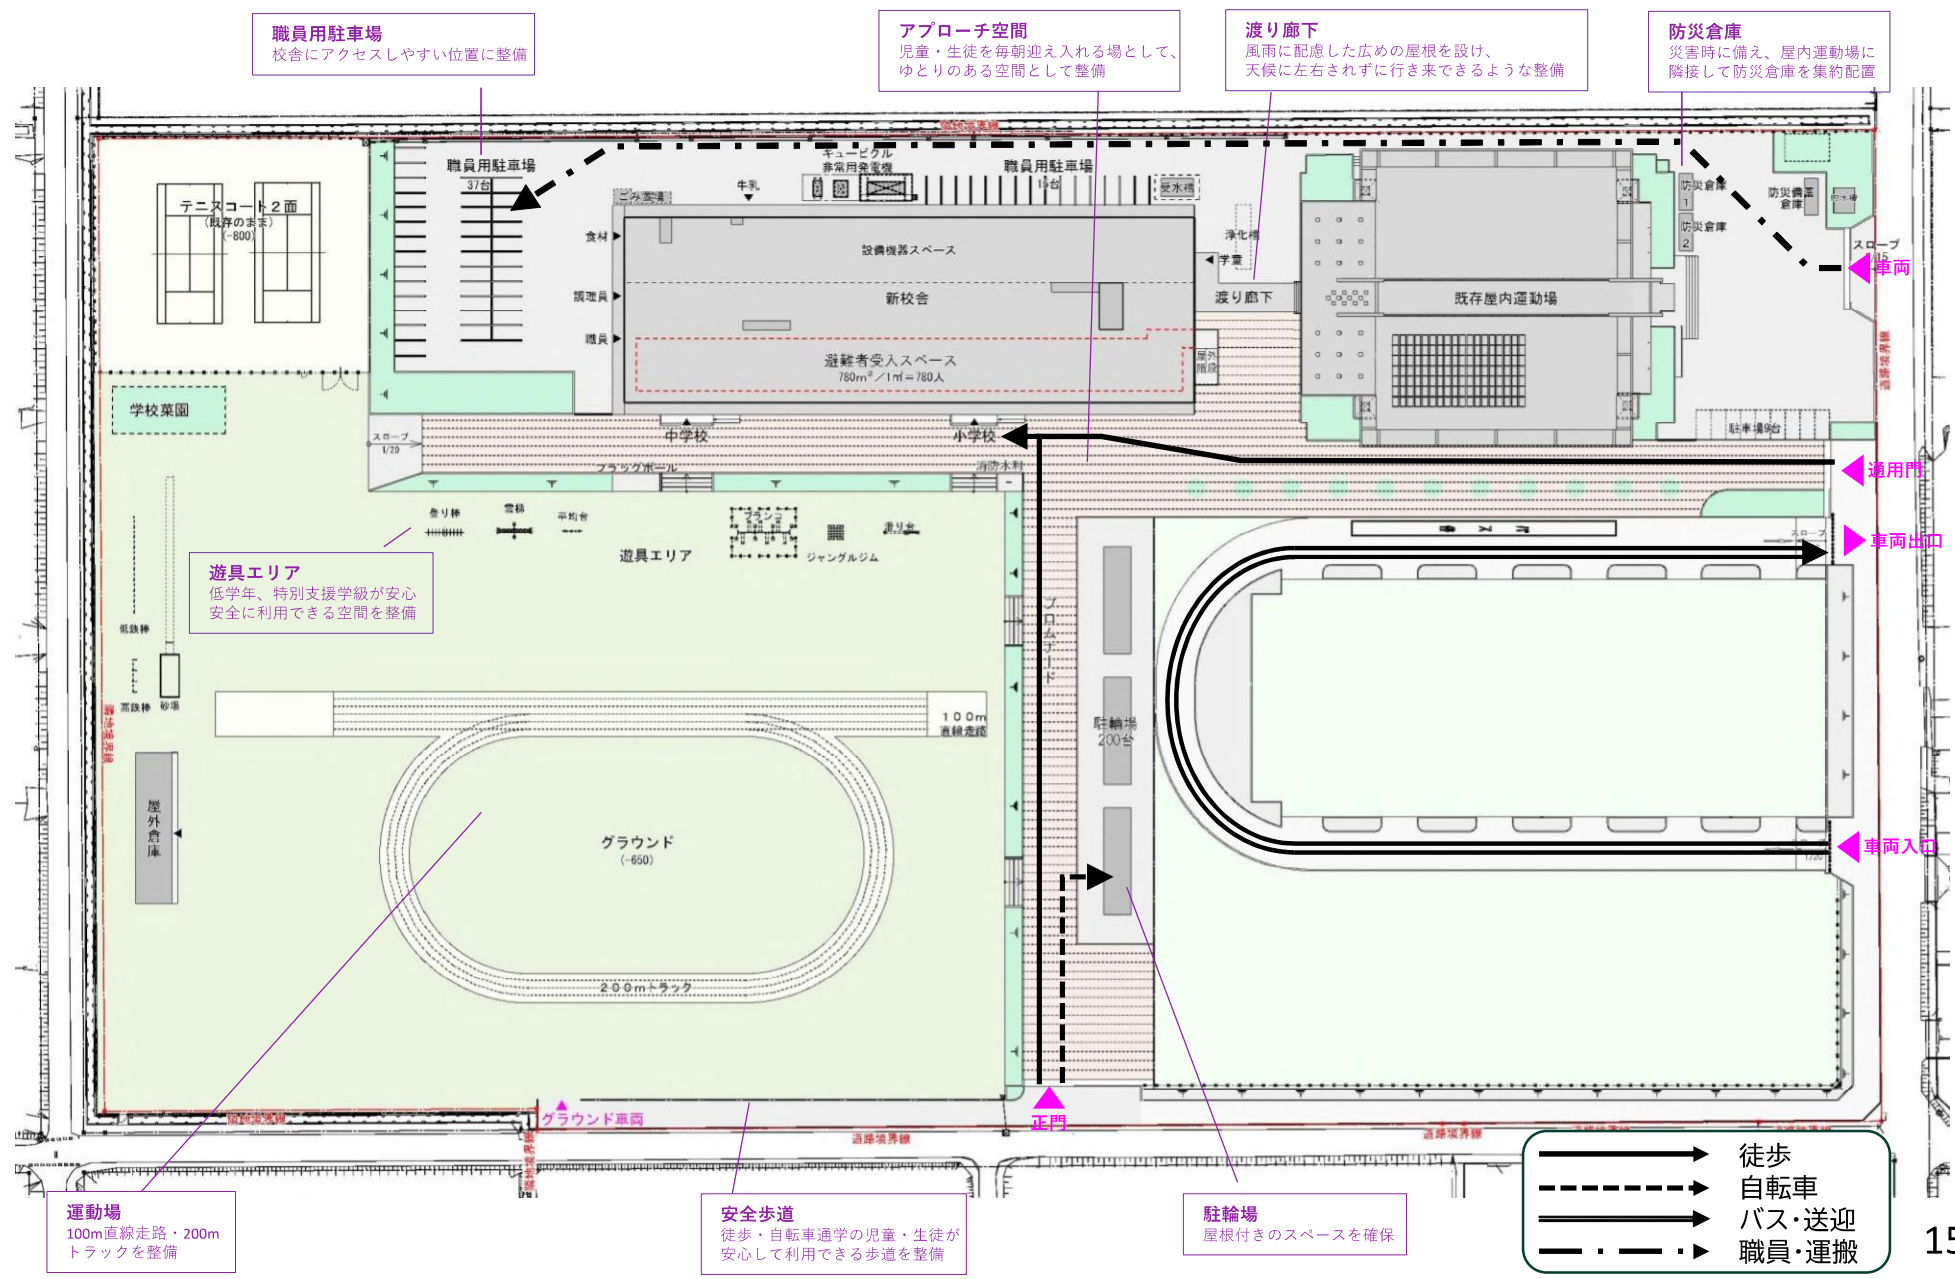

2-2. 建築計画 平面計画のコンセプト

■平面計画のコンセプト

主体的で・対話的で深い学びの空間

- ・メディアセンターを学校の中心に配置。多様な学習形態に対応。
- ・多目的ホールと連携し、協働的な学びを促す空間を整備。

健康的かつ安全で豊かな施設環境の確保

- ・自然採光・通風を取り入れ設備機器に頼らない学習環境を構築。
- ・バリアフリーに配慮した安全な施設環境を整備。

機能的で分かりやすい平面計画


- ・両端の階段配置により、避難時もスムーズな動線を確保。
- ・防犯性、安全性を備えた死角のない施設環境を整備。

2-2. 建築計画 ゾーニング計画

■ゾーニング計画

○1階ゾーニングの特徴

- ・管理ゾーンを集約、連携、見守りを重視
- ・学童は学校と明確に分離、管理しやすい計画
- ・昇降口前を広い空間とし、混雑緩和を図る
- ・回遊動線を設け、移動効率を高める

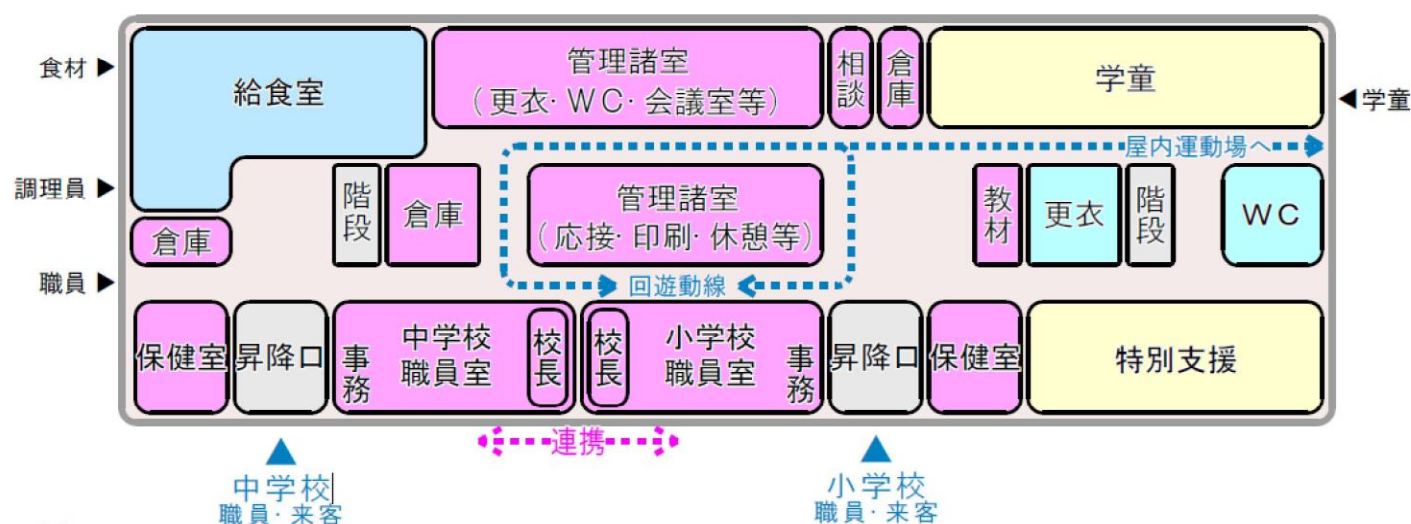


2-2. 建築計画 ゾーニング計画

■ゾーニング計画

○2, 3階ゾーニングの特徴


- ・小・中それぞれのエリアを明確に分離
- ・共有・連携エリアは校舎中央に配置
- ・小・中それぞれに階段を設置
- ・回遊動線を設け、移動効率を高める

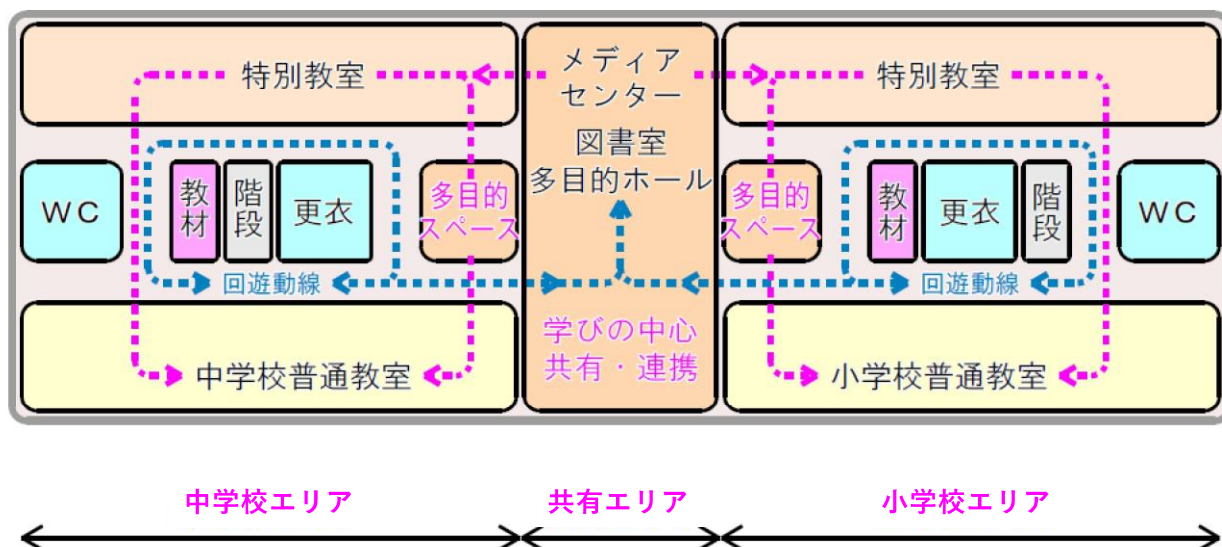

18

2-2. 建築計画 教室等配置計画


■教室等配置計画

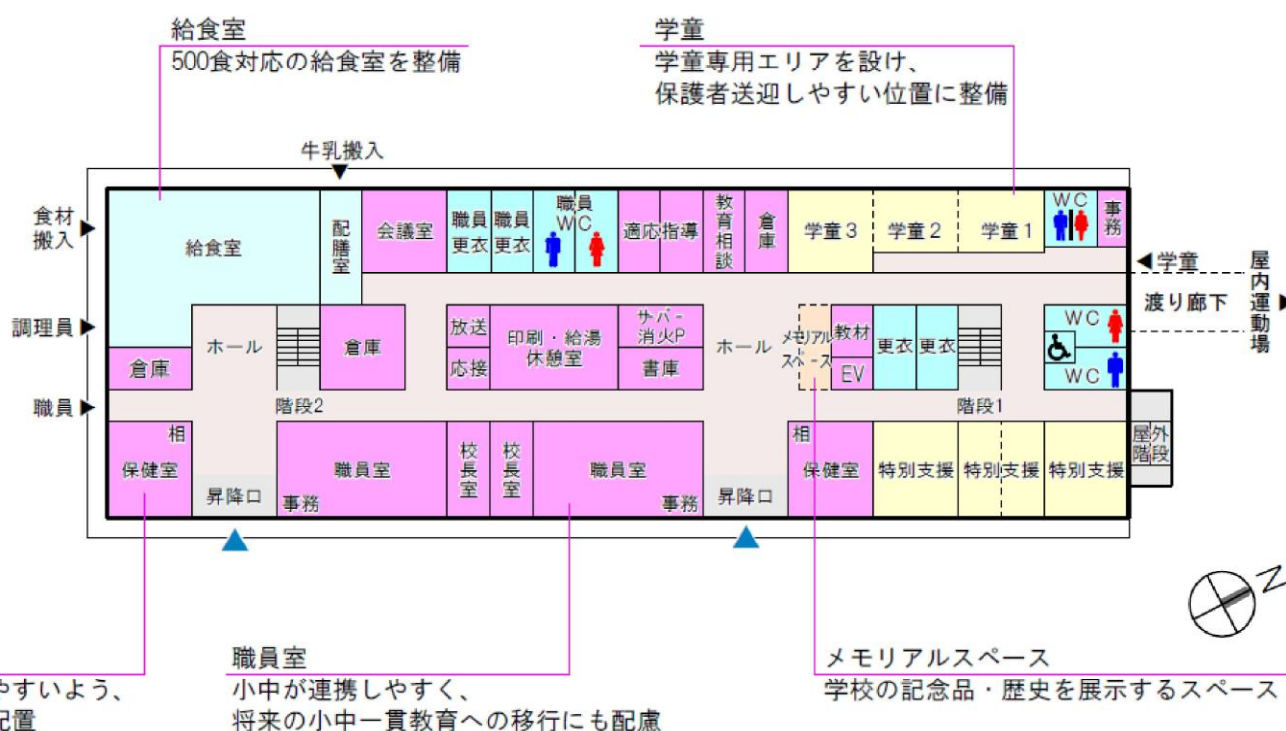

19

2-2. 建築計画 教室等配置計画


■教室等配置計画

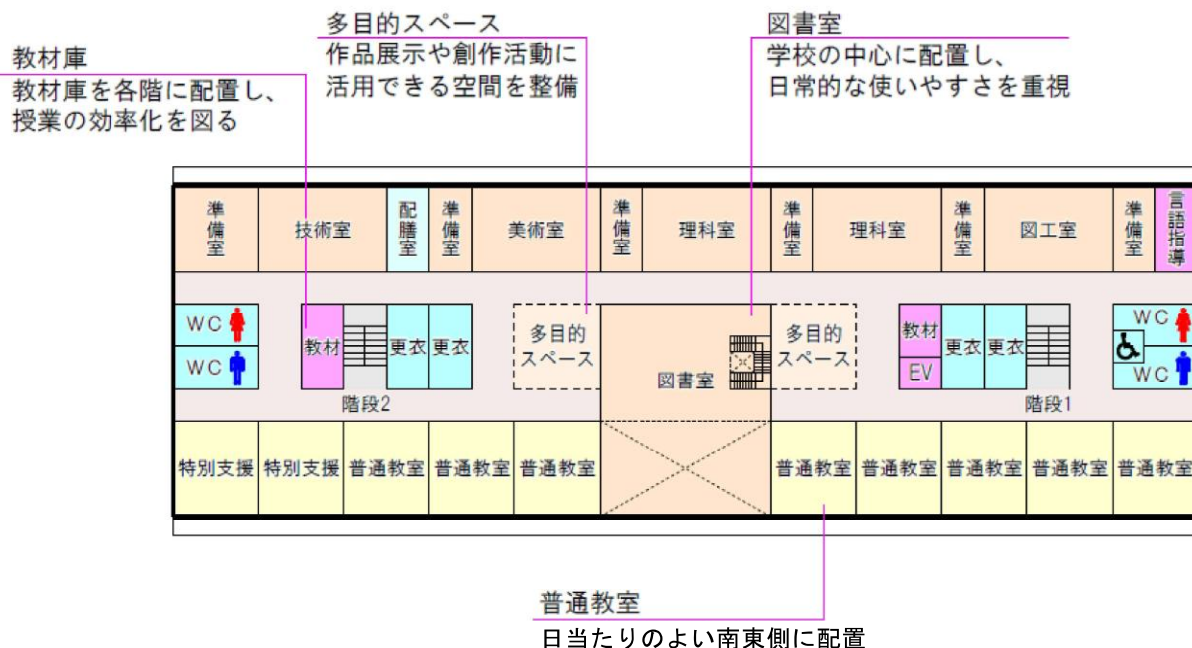

20

2-2. 建築計画 教室等配置計画

■教室等配置計画

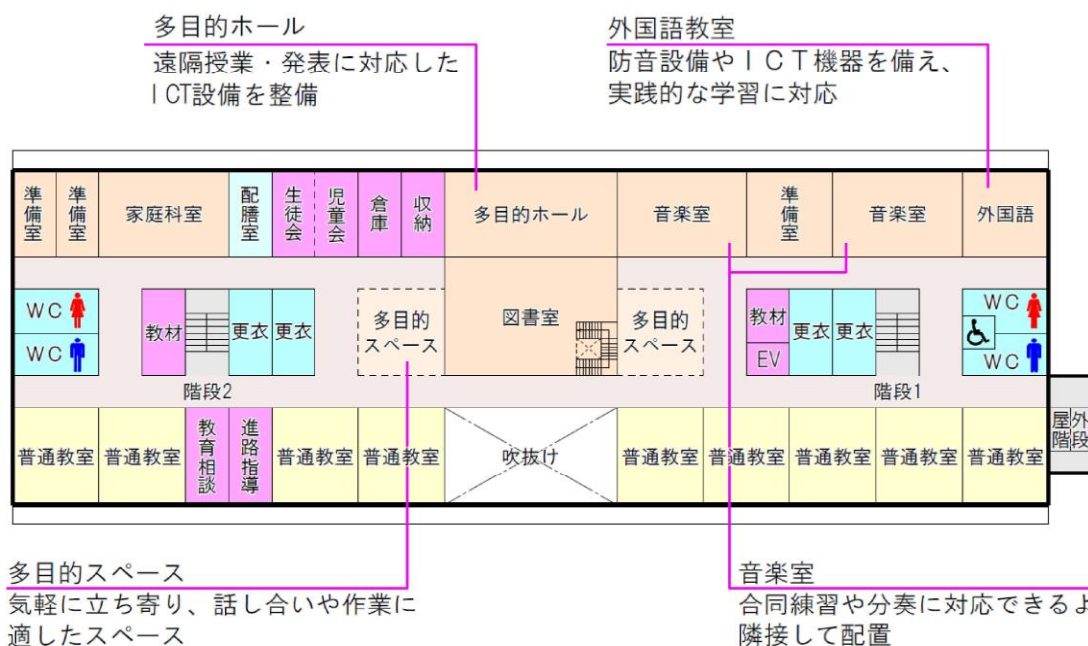


21


3-1. 事業スケジュール

[illegible]

A 現況図

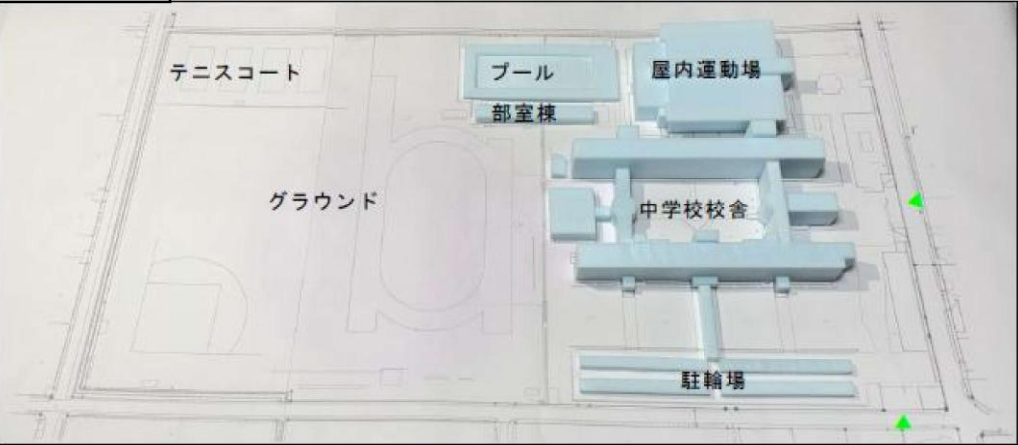


B プール・部室解体工事

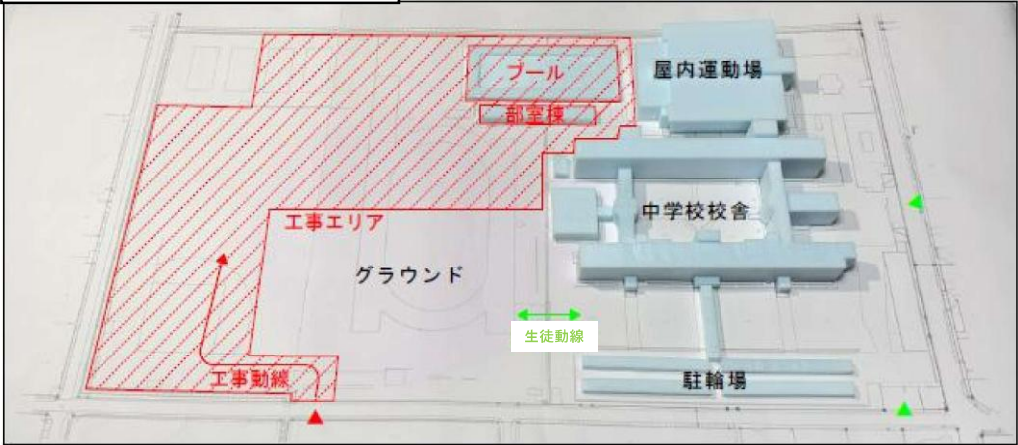


3-1. 事業スケジュール

		令和8年												令和9年												令和10年												令和11年												令和12年												令和13年																																																																																																																																																																																															
		令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度												令和13年度																																																																																																																																																																																															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																							
長期休み・行事		体育祭				夏休み						冬休み		卒業	入学	体育祭							夏休み						冬休み		卒業	入学	体育祭							夏休み							冬休み		卒業	入学	体育祭							夏休み						冬休み																																																																																																																																																																																													
児童生徒 影響	校舎利用状況	既存校舎利用																																				中学校引越																																				統合小学校開校																																																																																																																																																																																			
	グラウンド利用状況	既存グラウンド利用												グラウンド一部利用																																				新グラウンド利用																																																																																																																																																																																																											
工事区分	① プール・部室・倉庫 解体工事	解体工事(5.5ヶ月)																																				新校舎建設工事(23ヶ月)																																				新校舎供用開始																																																																																																																																																																																			
	② 新校舎建設工事																																																																																																																																																																																																																																																												
	③ グラウンド工事																																																																									グラウンド工事(6ヶ月)																																																																																																																																																																																			
	④ 既存校舎解体工事																																																																									解体工事(12ヶ月)																																																																																																																																																																																			
	⑤ 駐車場外構工事																																																																									駐車場外構工事(6.5ヶ月)																																																																																																																																																																																			
工事計画手順		A																																				B																																				C																																				D																																				E																																				F																																				G																																			

E 既存校舍解体工事

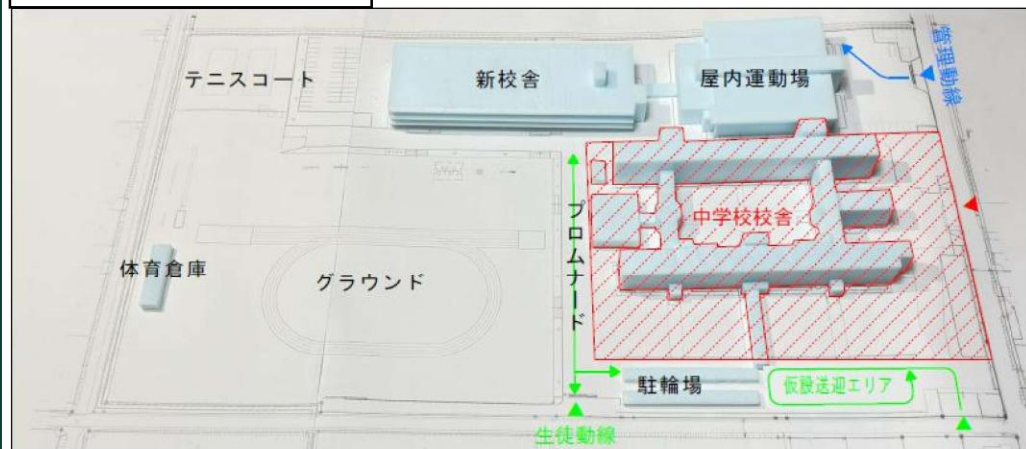


F 駐車場外構工事

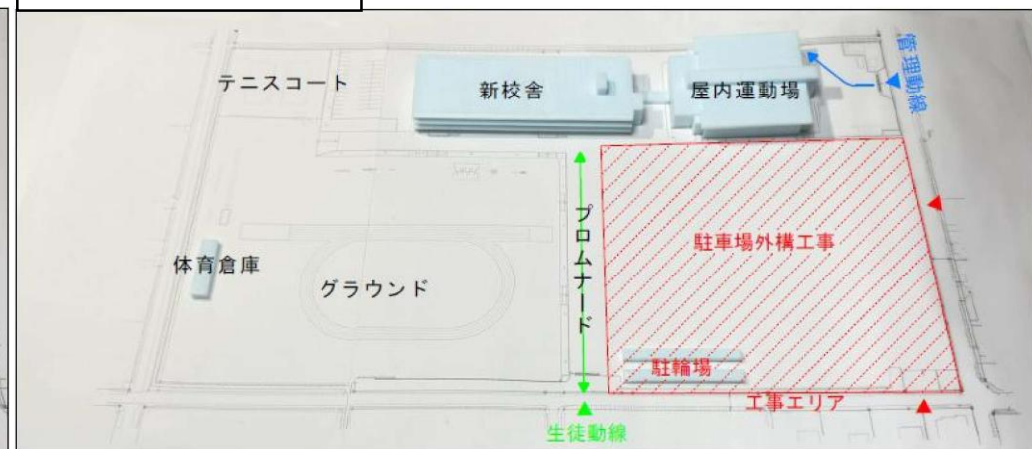

3-1. 事業スケジュール

G 完成

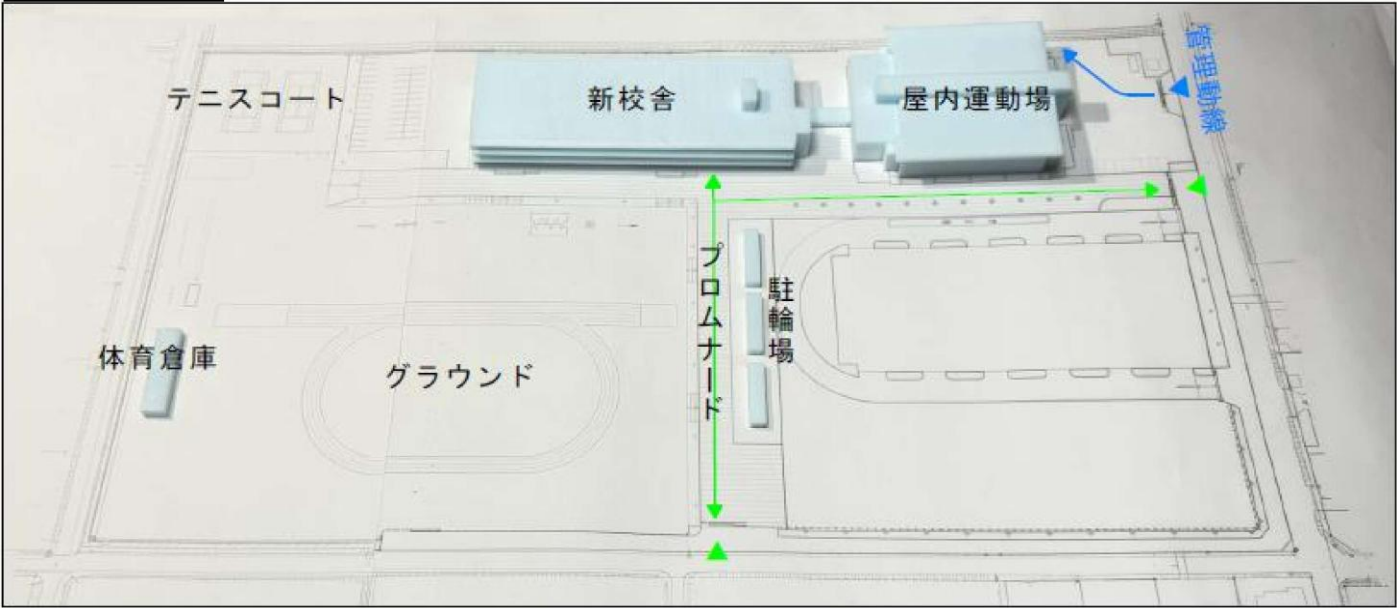

3-2. 小学校統合における業務スケジュール(案)

	令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
学校名																																																
公立学校施設整備費 負担金交付申請																																																
校章																																																
校歌																																																
スクールバス導入協議・検証																																																
学校行事検討																																																
PTA活動協議																																																

- 上記の内容について、本素案を基に専門部会及び推進委員会と協議し決定します。
- 交付申請までには学校名を決定します。
- 学校名及び校歌については、公募等により住民の意見を取り入れながら検討します。
- スクールバス導入については、地域の意向を踏まえつつ、安全かつ経済的な導入方法を検討します。
